

Reposta às pendências técnicas – Reforma do Ginásio de Esportes e Ampliação com Construção de Cancha de Bocha (Ofício 1552 / 2019 / REGOV/CV)

2.1 PROJETO

2.1.1 Projeto Prevenção Contra Incêndio


2.1.1.1 e 2.1.1.2 O Projeto está sendo apresentado, aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

2.2 ORÇAMENTO

2.2.1 Memorial de cálculo:

Código 72131 - ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM

Essa alvenaria ficará “á vista”, ou seja, não levará revestimento de chapisco, emboço e reboco; corresponde ao fechamento de aberturas que serão retiradas, conforme indicado na planta abaixo (no Proj Arquitetônico é possível fazer a verificação das medidas – Planta Baixa, Corte e Planta de Demolição):

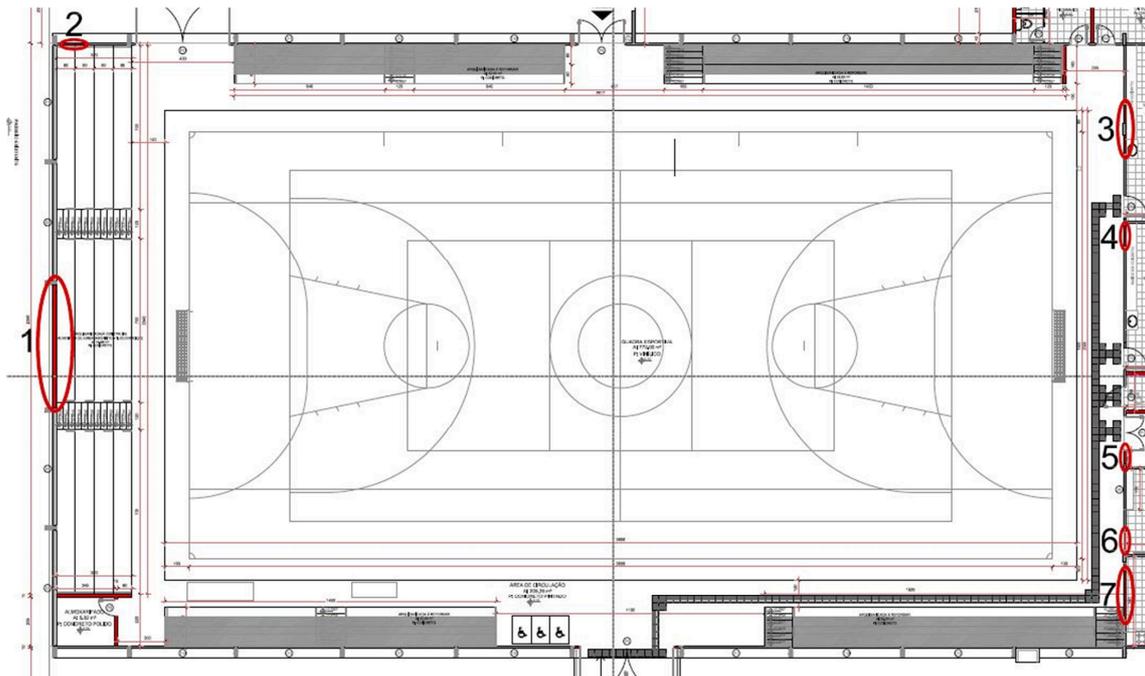

1	- 5,23 x 3,57 =	18,67 m ²
2	- 0,90 x 2,21 =	1,89 m ²
3	- 0,80 x 2,21 = 1,68 x 2	3,36 m ²
4	- 0,90 x 2,21 =	1,89 m ²
5	- 0,70 x 2,10 =	1,47 m ²
6	- 0,80 x 2,10 =	1,68 m ²
7	- 2,15 x 1,15 =	2,47 m ²

31,44 m²

2.2.2 Foram corrigidos os valores na PLQ, porém o valor no m² da Recreação ficou 258,25, pois foi considerado no cálculo a área dos Lavabos e Depósito/Lavanderia.

- Em caso de dúvida, nos colocamos a disposição pelo telefone (46) 3543-1020 ou e-mail dezeen.arquitetura@hotmail.com.

Nova Esperança do Sudoeste, 02 de Julho de 2019.
